



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

## Comune di PONTECAGNANO FAIANO

(Provincia di Salerno)

INTERVENTO DENOMINATO "EX CAMINO REAL" IN VIA MAR MEDITERRANEO E VALORIZZAZIONE CON LA COSTRUZIONE DI UN CENTRO RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA. CUP: F62F22000210006.

*Interventi rientranti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nel Piano Nazionale Complementare Missione 5 (Inclusione Sociale) Componente 3 (Interventi speciali per la coesione sociale) Investimento 2 - Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall'unione europea - NEXTGENERATIONEU*

### PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO



Elaborato:

PSC

### DIAGRAMMA DI GANTT



Salerno febbraio 2025

Agg.

TAV.


PE

ALL. A

PROGETTISTA  
Ing. Niggio BONADIES

IL R.U.P.  
Arch. Giovanni LANDI

V. IL SINDACO  
Dott. Giuseppe LANZARA

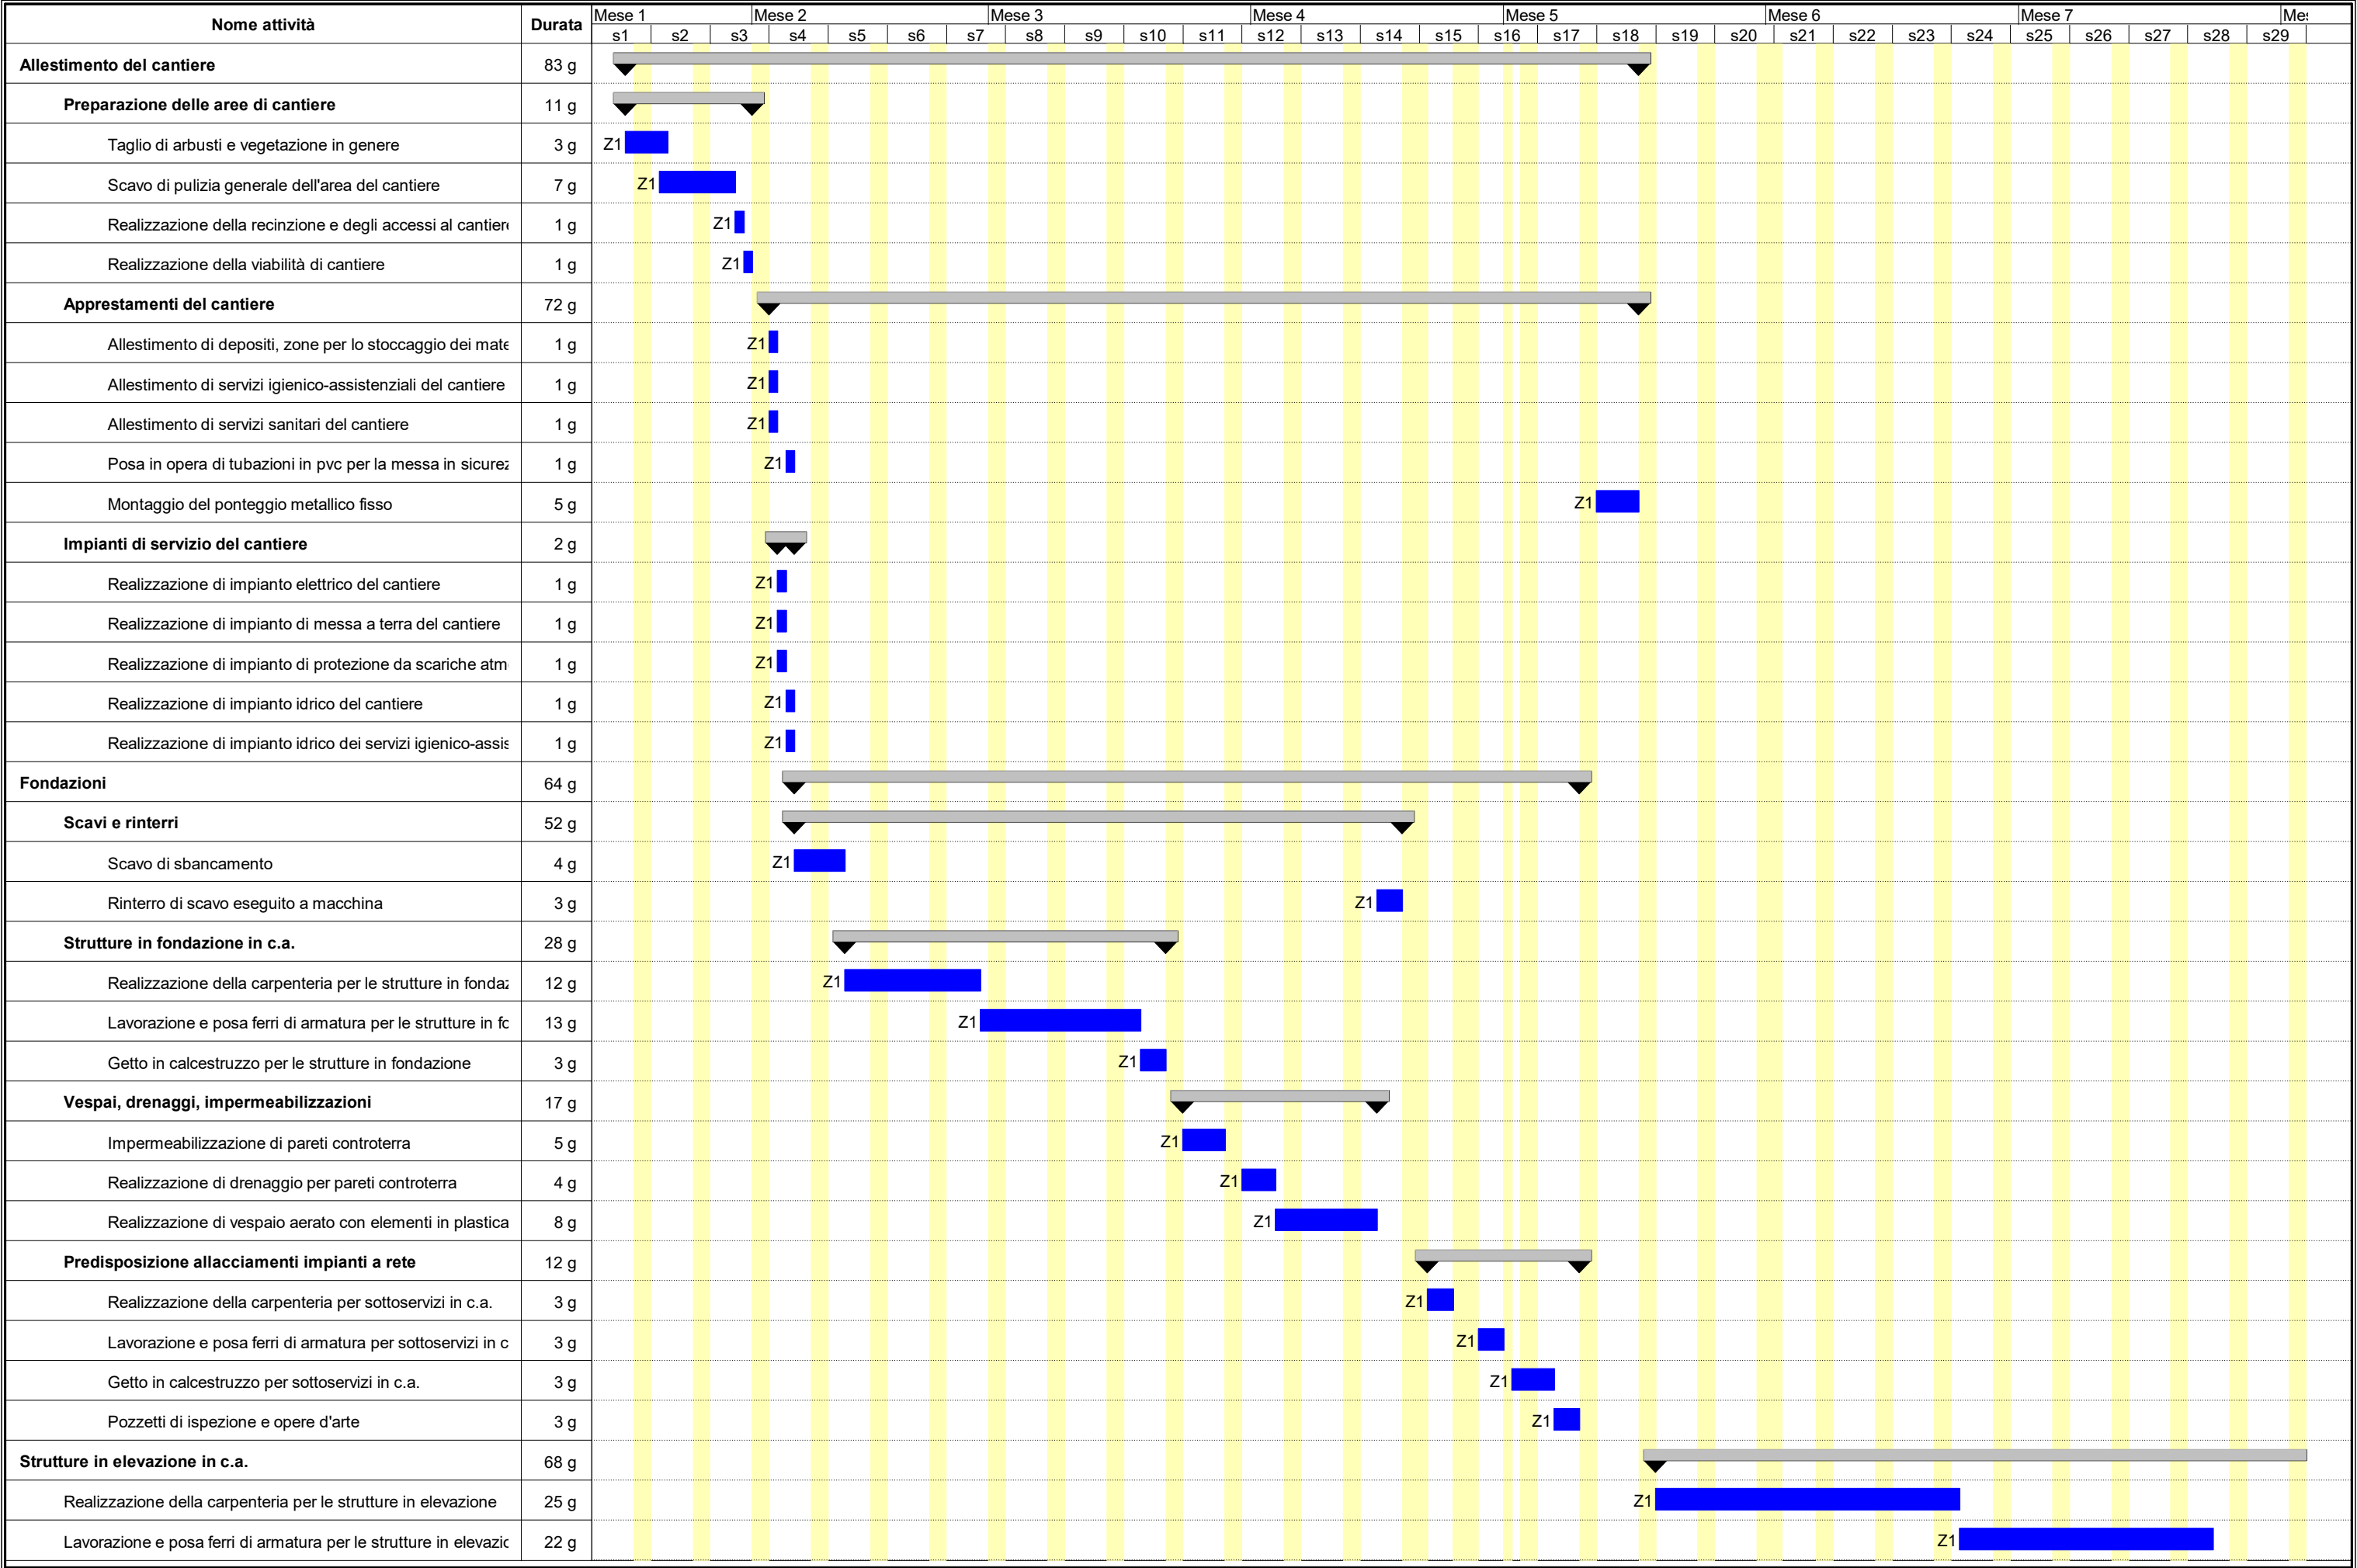


Nome attività	Durata	Mese 1			Mese 2			Mese 3			Mese 4				Mese 5				Mese 6				Mese 7				Mese 8				
		s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	s27	s28	s29	
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. in opera	17 g																														
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	4 g																														
Coperture in latero-cemento	21 g																														
Realizzazione di solaio in c.a. in opera	5 g																														
Formazione di massetto per coperture	5 g																														
Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali	5 g																														
Impermeabilizzazione di coperture	6 g																														
Opere di completamento in copertura	11 g																														
Montaggio di scossaline e canali di gronda	8 g																														
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione	3 g																														
Finiture per balconi	23 g																														
Formazione di massetto per balconi e logge	8 g																														
Impermeabilizzazione di balconi e logge	8 g																														
Posa di pavimenti su balconi e logge	7 g																														
Tamponatura intonacata	55 g																														
Realizzazione di tamponature	15 g																														
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali	14 g																														
Formazione intonaci esterni industrializzati	16 g																														
Tinteggiatura di superfici esterne	10 g																														
Impianti	176 g																														
Assistenze murarie per impianti	9 g																														
Esecuzione di tracce eseguite a mano	9 g																														
Impianto elettrico	21 g																														
Realizzazione di impianto elettrico	15 g																														
Realizzazione di impianto di messa a terra	3 g																														
Realizzazione di impianto antenna TV	3 g																														
Impianto idrico-sanitario e del gas	146 g																														
Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria	5 g																														
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico	10 g																														
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas	3 g																														
Montaggio di apparecchi igienico sanitari	4 g																														
Impianto di condizionamento	15 g																														
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata	11 g																														
Posa della macchina di condizionamento	4 g																														
Impianto rete dati e fonia	8 g																														
Realizzazione di impianto di rete dati	3 g																														
Realizzazione di impianto telefonico	2 g																														
Realizzazione di impianto citofonico	3 g																														

Nome attività	Durata	Mese 1			Mese 2			Mese 3			Mese 4				Mese 5				Mese 6				Mese 7				Mese 8			
		s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	s27	s28	s29
Impianto termico	8 g																													
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per i	8 g																													
Installazione di pompa di calore	3 g																													
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico	6 g																													
Lavori interni	65 g																													
Pareti divisorie e sistemi di isolamento	10 g																													
Realizzazione di tramezzature interne in laterizio	10 g																													
Intonaci e pitturazioni interne	15 g																													
Formazione intonaci interni (tradizionali)	9 g																													
Tinteggiatura di superfici interne	6 g																													
Massetti e pavimenti interni	23 g																													
Formazione di massetto per pavimenti interni	9 g																													
Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo	5 g																													
Posa di pavimenti per interni in ceramica	9 g																													
Rivestimenti interni	11 g																													
Posa in opera di copertine in marmo	5 g																													
Posa di rivestimenti interni in ceramica	6 g																													
Serramenti interni	6 g																													
Montaggio di porte interne	6 g																													
Serramenti esterni	19 g																													
Montaggio di porte per esterni	4 g																													
Montaggio di serramenti esterni	8 g																													
Montaggio di serrande avvolgibili	7 g																													
Finiture esterne	33 g																													
Recinzioni e ringhiere	10 g																													
Posa di recinzioni e cancellate	5 g																													
Posa di ringhiere e parapetti	5 g																													
Allacciamenti impianti a rete	10 g																													
Posa di conduttura elettrica	2 g																													
Posa di conduttura idrica	2 g																													
Posa di conduttura fognaria	4 g																													
Posa di conduttura del gas	2 g																													
Pavimentazioni esterne	13 g																													
Formazione di fondazione stradale	9 g																													
Formazione di manto di usura e collegamento	4 g																													
Smobilizzo del cantiere	4 g																													
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	2 g																													
Smobilizzo del cantiere	1 g																													

[illegible]





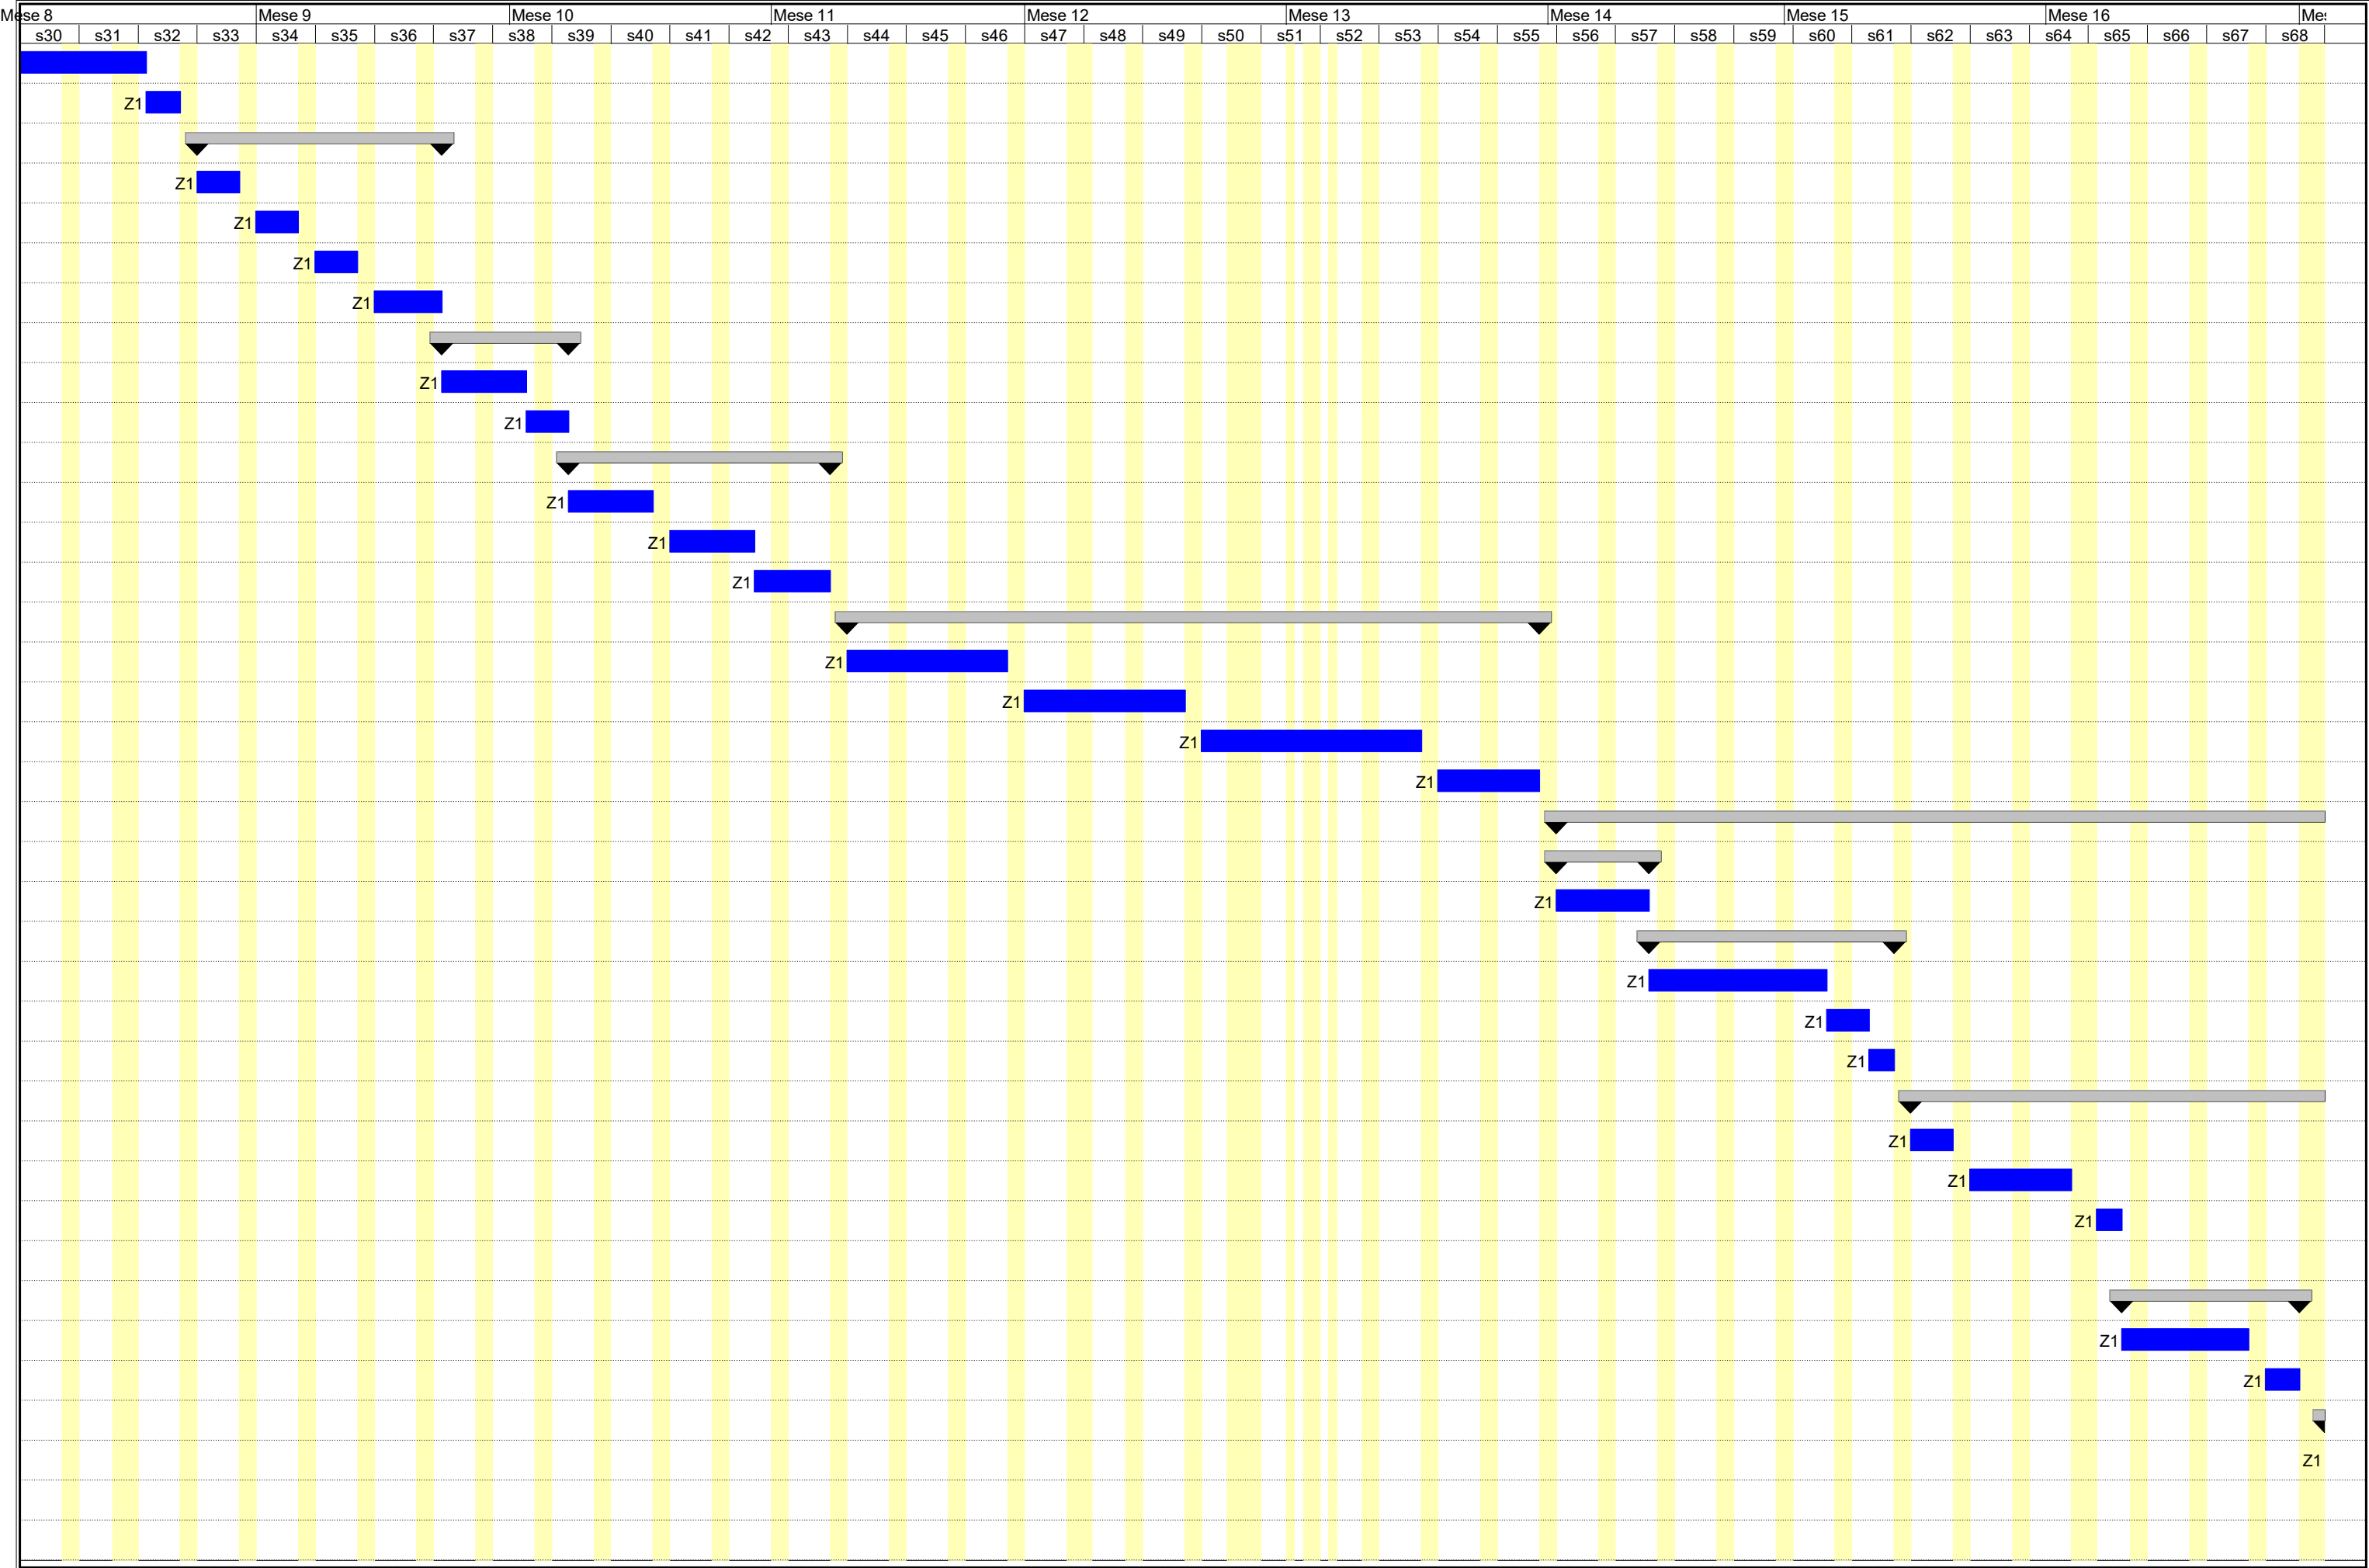


[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

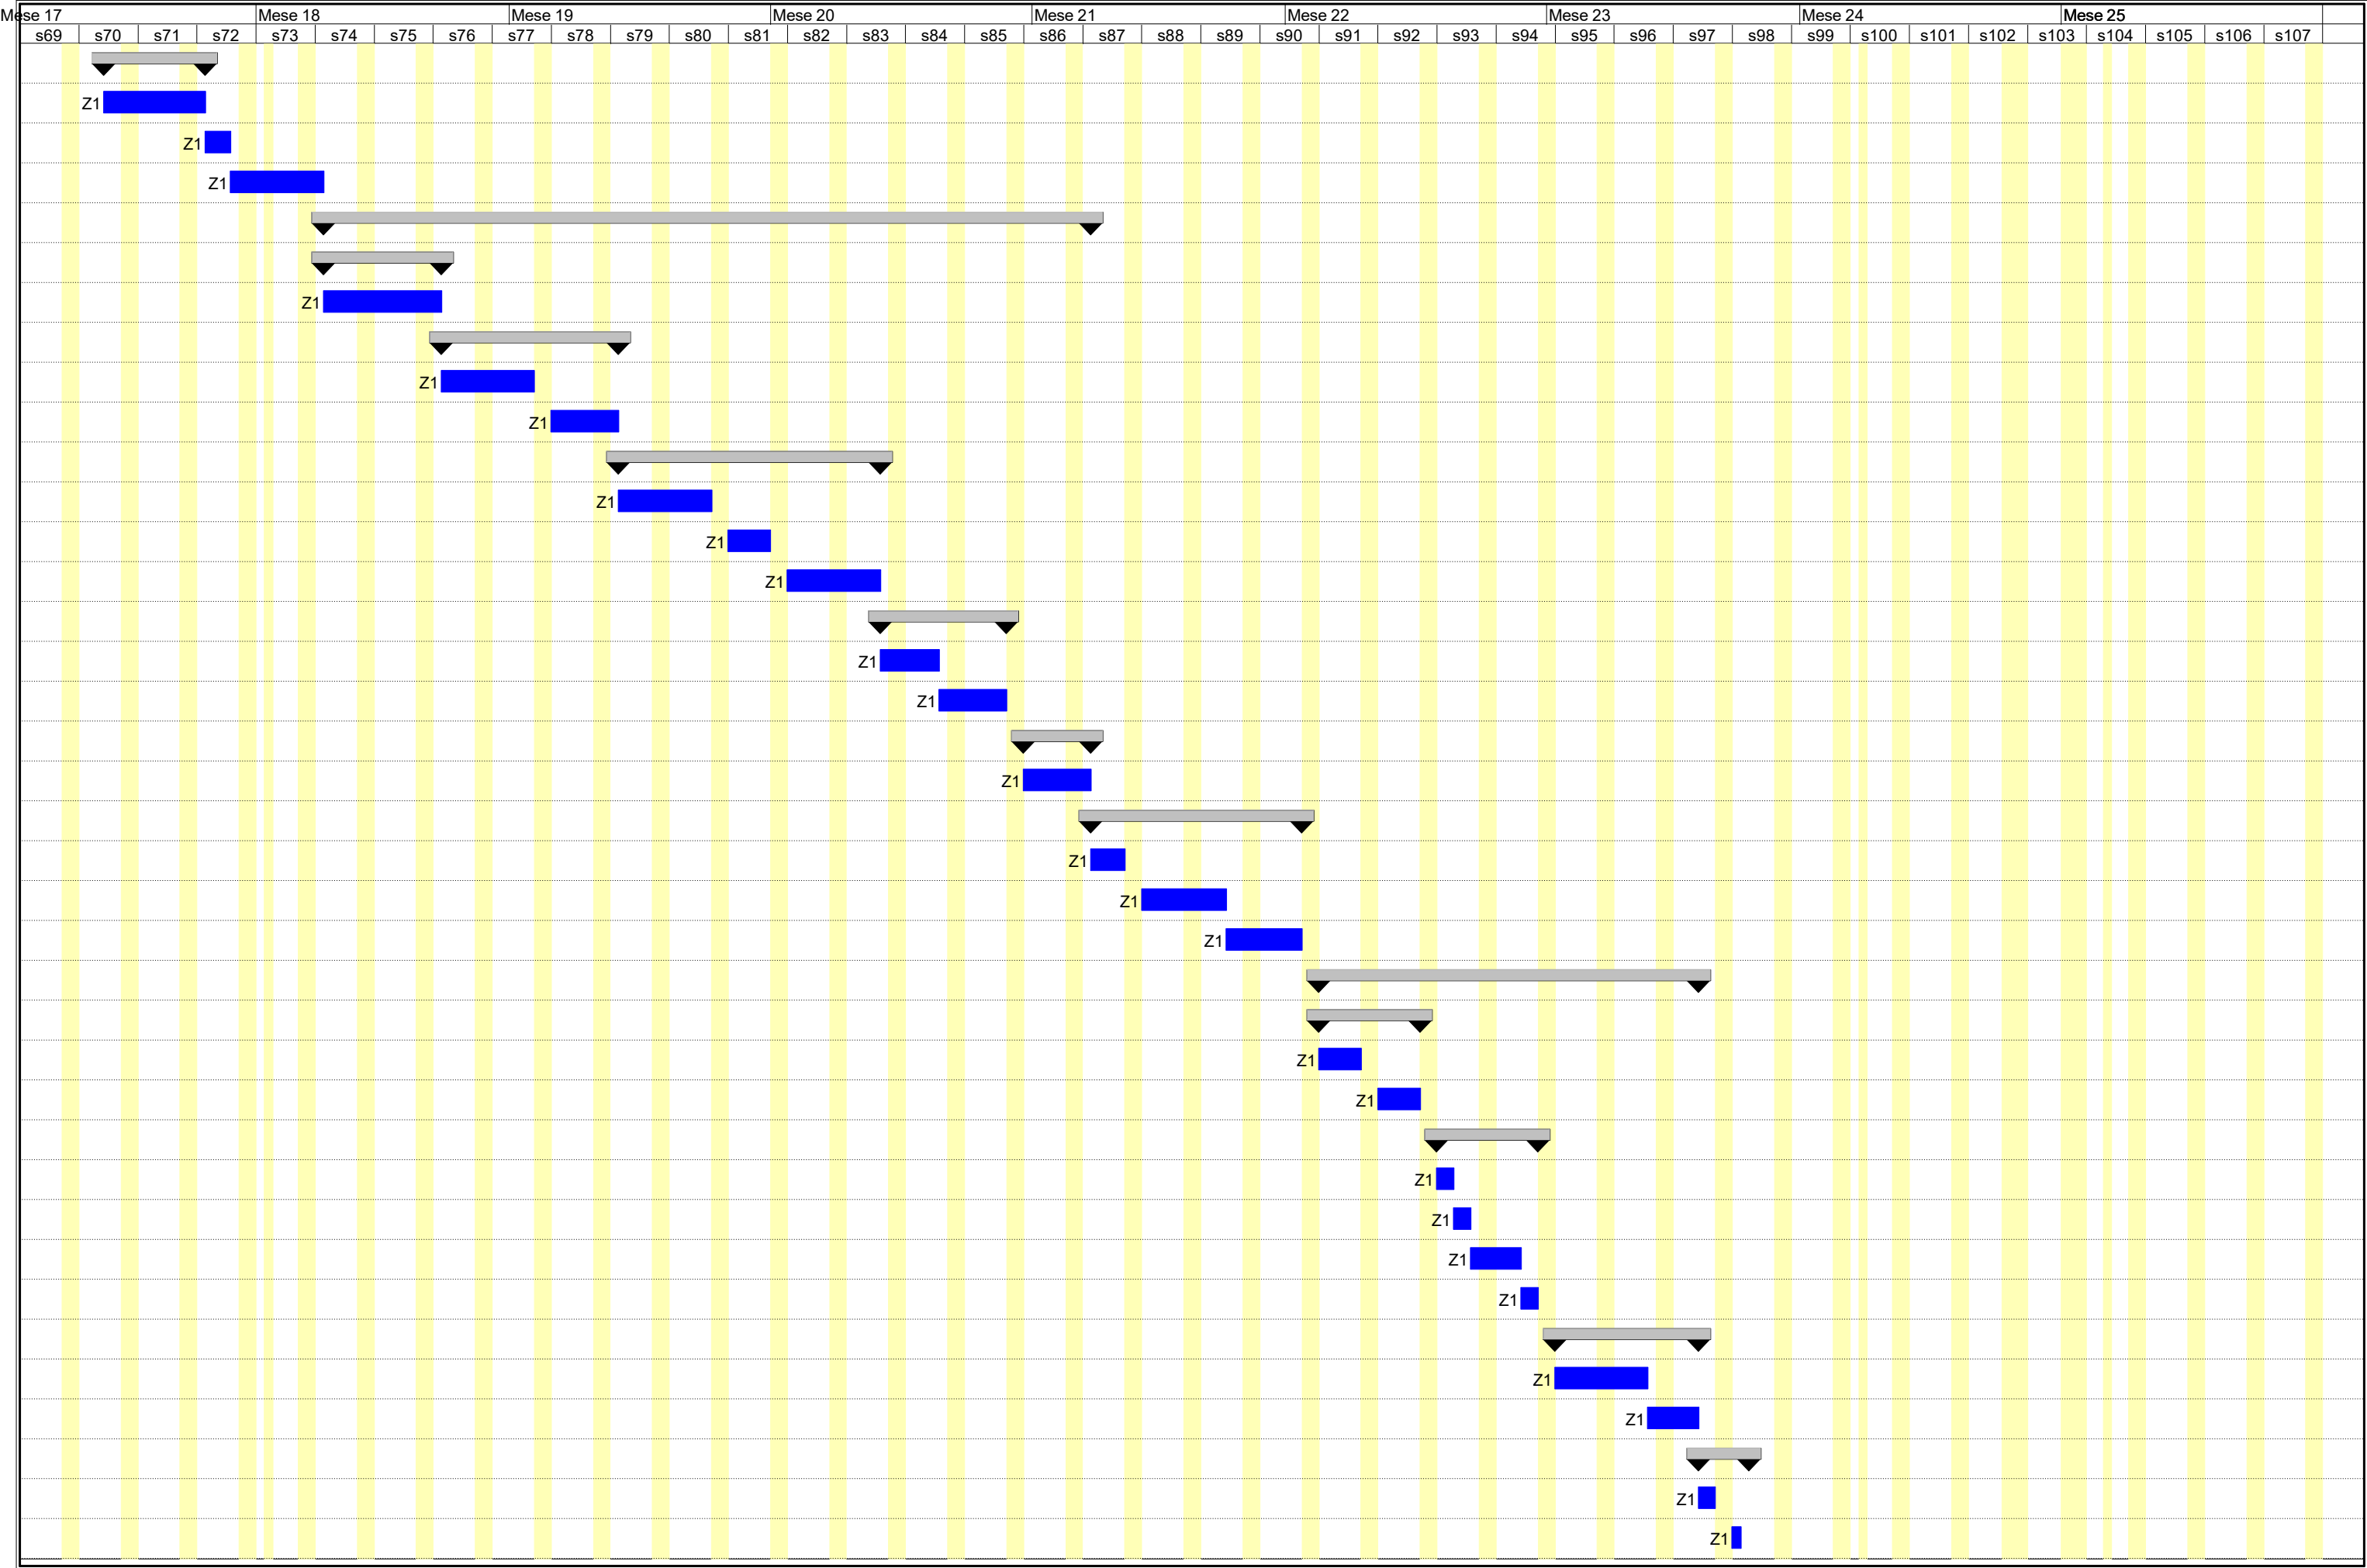

[illegible]
