



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

# Comune di PONTECAGNANO FAIANO

(Provincia di Salerno)

INTERVENTO DENOMINATO "EX CAMINO REAL" IN VIA MAR MEDITERRANEO E VALORIZZAZIONE CON LA COSTRUZIONE DI UN CENTRO RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA. CUP: F62F22000210006.

*Interventi rientranti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nel Piano Nazionale Complementare Missione 5 (Inclusione Sociale) Componente 3 (Interventi speciali per la coesione sociale) Investimento 2 - Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall'unione europea - NEXTGENERATIONEU*

## PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO



Elaborato:

GENERALI

CRONOPROGRAMMA



Salerno febbraio 2025

Agg.

TAV.

PE

KP

PROGETTISTA  
Ing. Niggio BONADIES

IL R.U.P.  
Arch. Giovanni LANDI

V. IL SINDACO  
Dott. Giuseppe LANZARA

# Comune di Pontecagnano Faiano

## Provincia di Salerno

**OGGETTO:** INTERVENTO DENOMINATO "EX CAMINO REAL" IN VIA MAR MEDITERRANEO E VALORIZZAZIONE CON LA COSTRUZIONE DI UN CENTRO RIFIUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA

**COMMITTENTE:** Amm.ne comunale Pontecagnano Faiano

## RELAZIONE

### CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione è stato redatto ai sensi dell'art. 30 dell'All. I.7 del D.lgs. 36/2023.

#### Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari **365** giorni naturali e consecutivi.

#### Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché della chiusura dei cantieri per festività.

Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

#### Tabella Climatico Ambientale:

condizione	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	media
Favorevole	90	90	90	90	90	90	90	45	90	90	90	45	82.5
Normale	15	15	75	90	90	90	90	45	90	90	75	15	65
Sfavorevole	15	15	45	90	90	90	90	45	90	75	45	15	58.75

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale.

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione,

che nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

### **Produzione mensile**

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che l'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di euro 142'262,21 ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro 196'436,88 .

L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovrà stilare prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato cronoprogramma.


### **Prezzo Chiuso**


L'allegato cronoprogramma dei lavori è redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l'importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna.

Di seguito si riportano gli importi dei lavori da eseguire per anni interi a decorrere dalla consegna dei lavori:

- anno 1 - **Importo** euro 1'707'146,51;
- anno 2 - **Importo** euro 0,00;

Il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso d'inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.

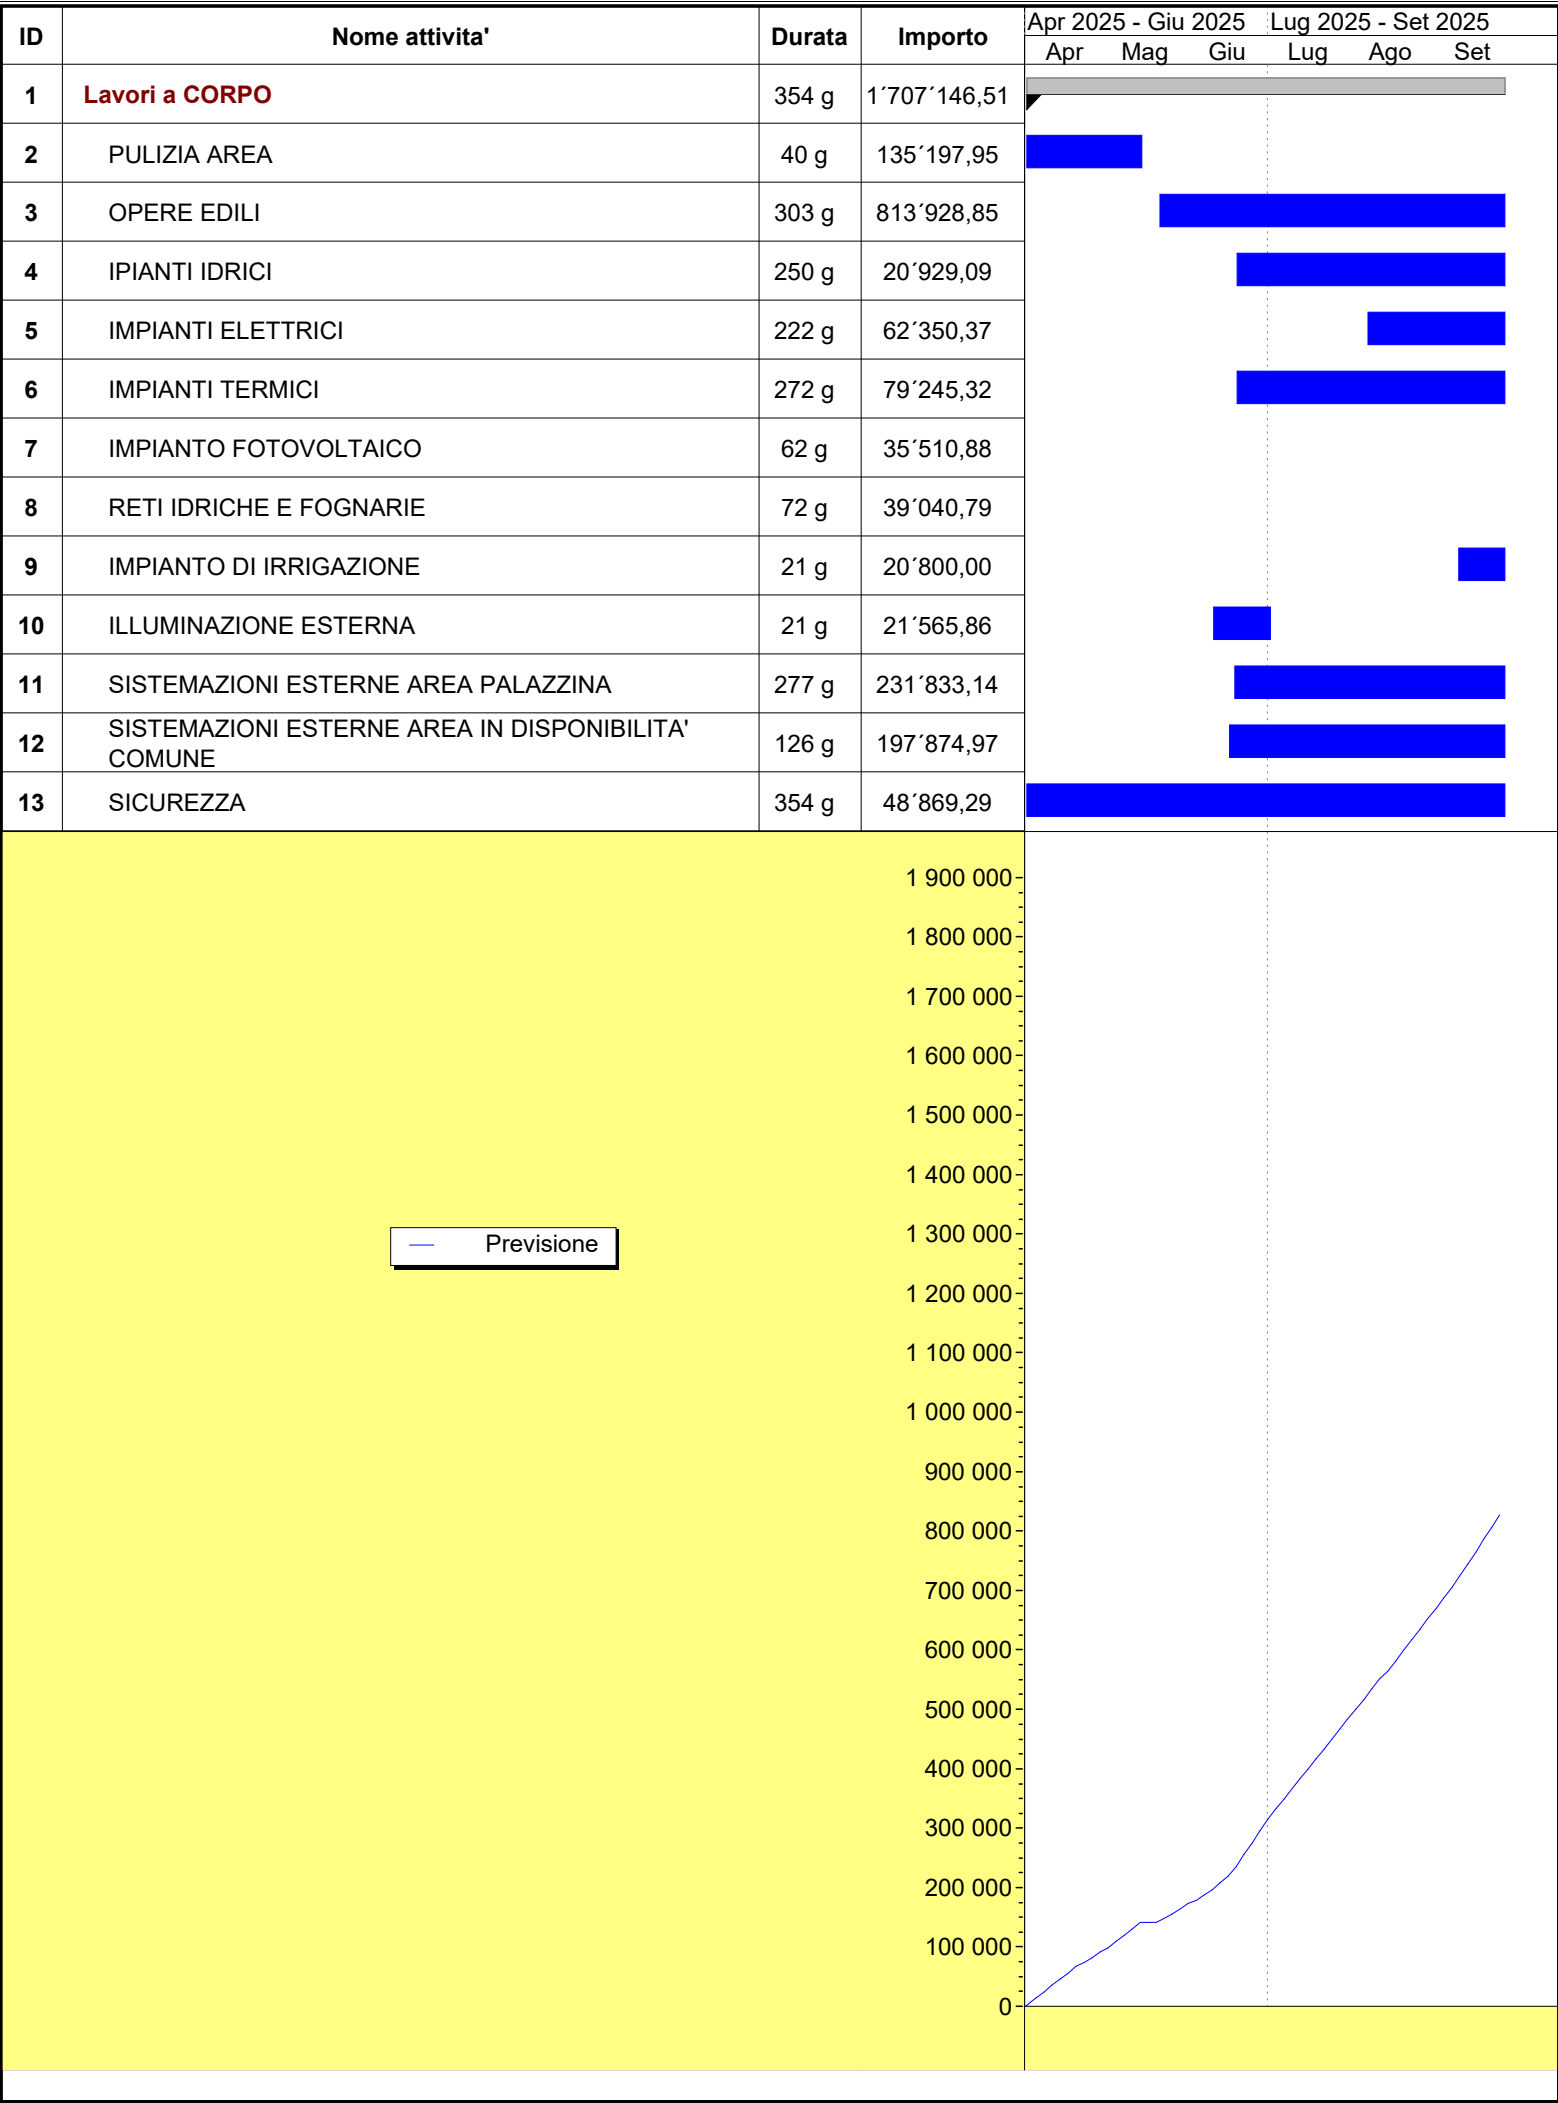

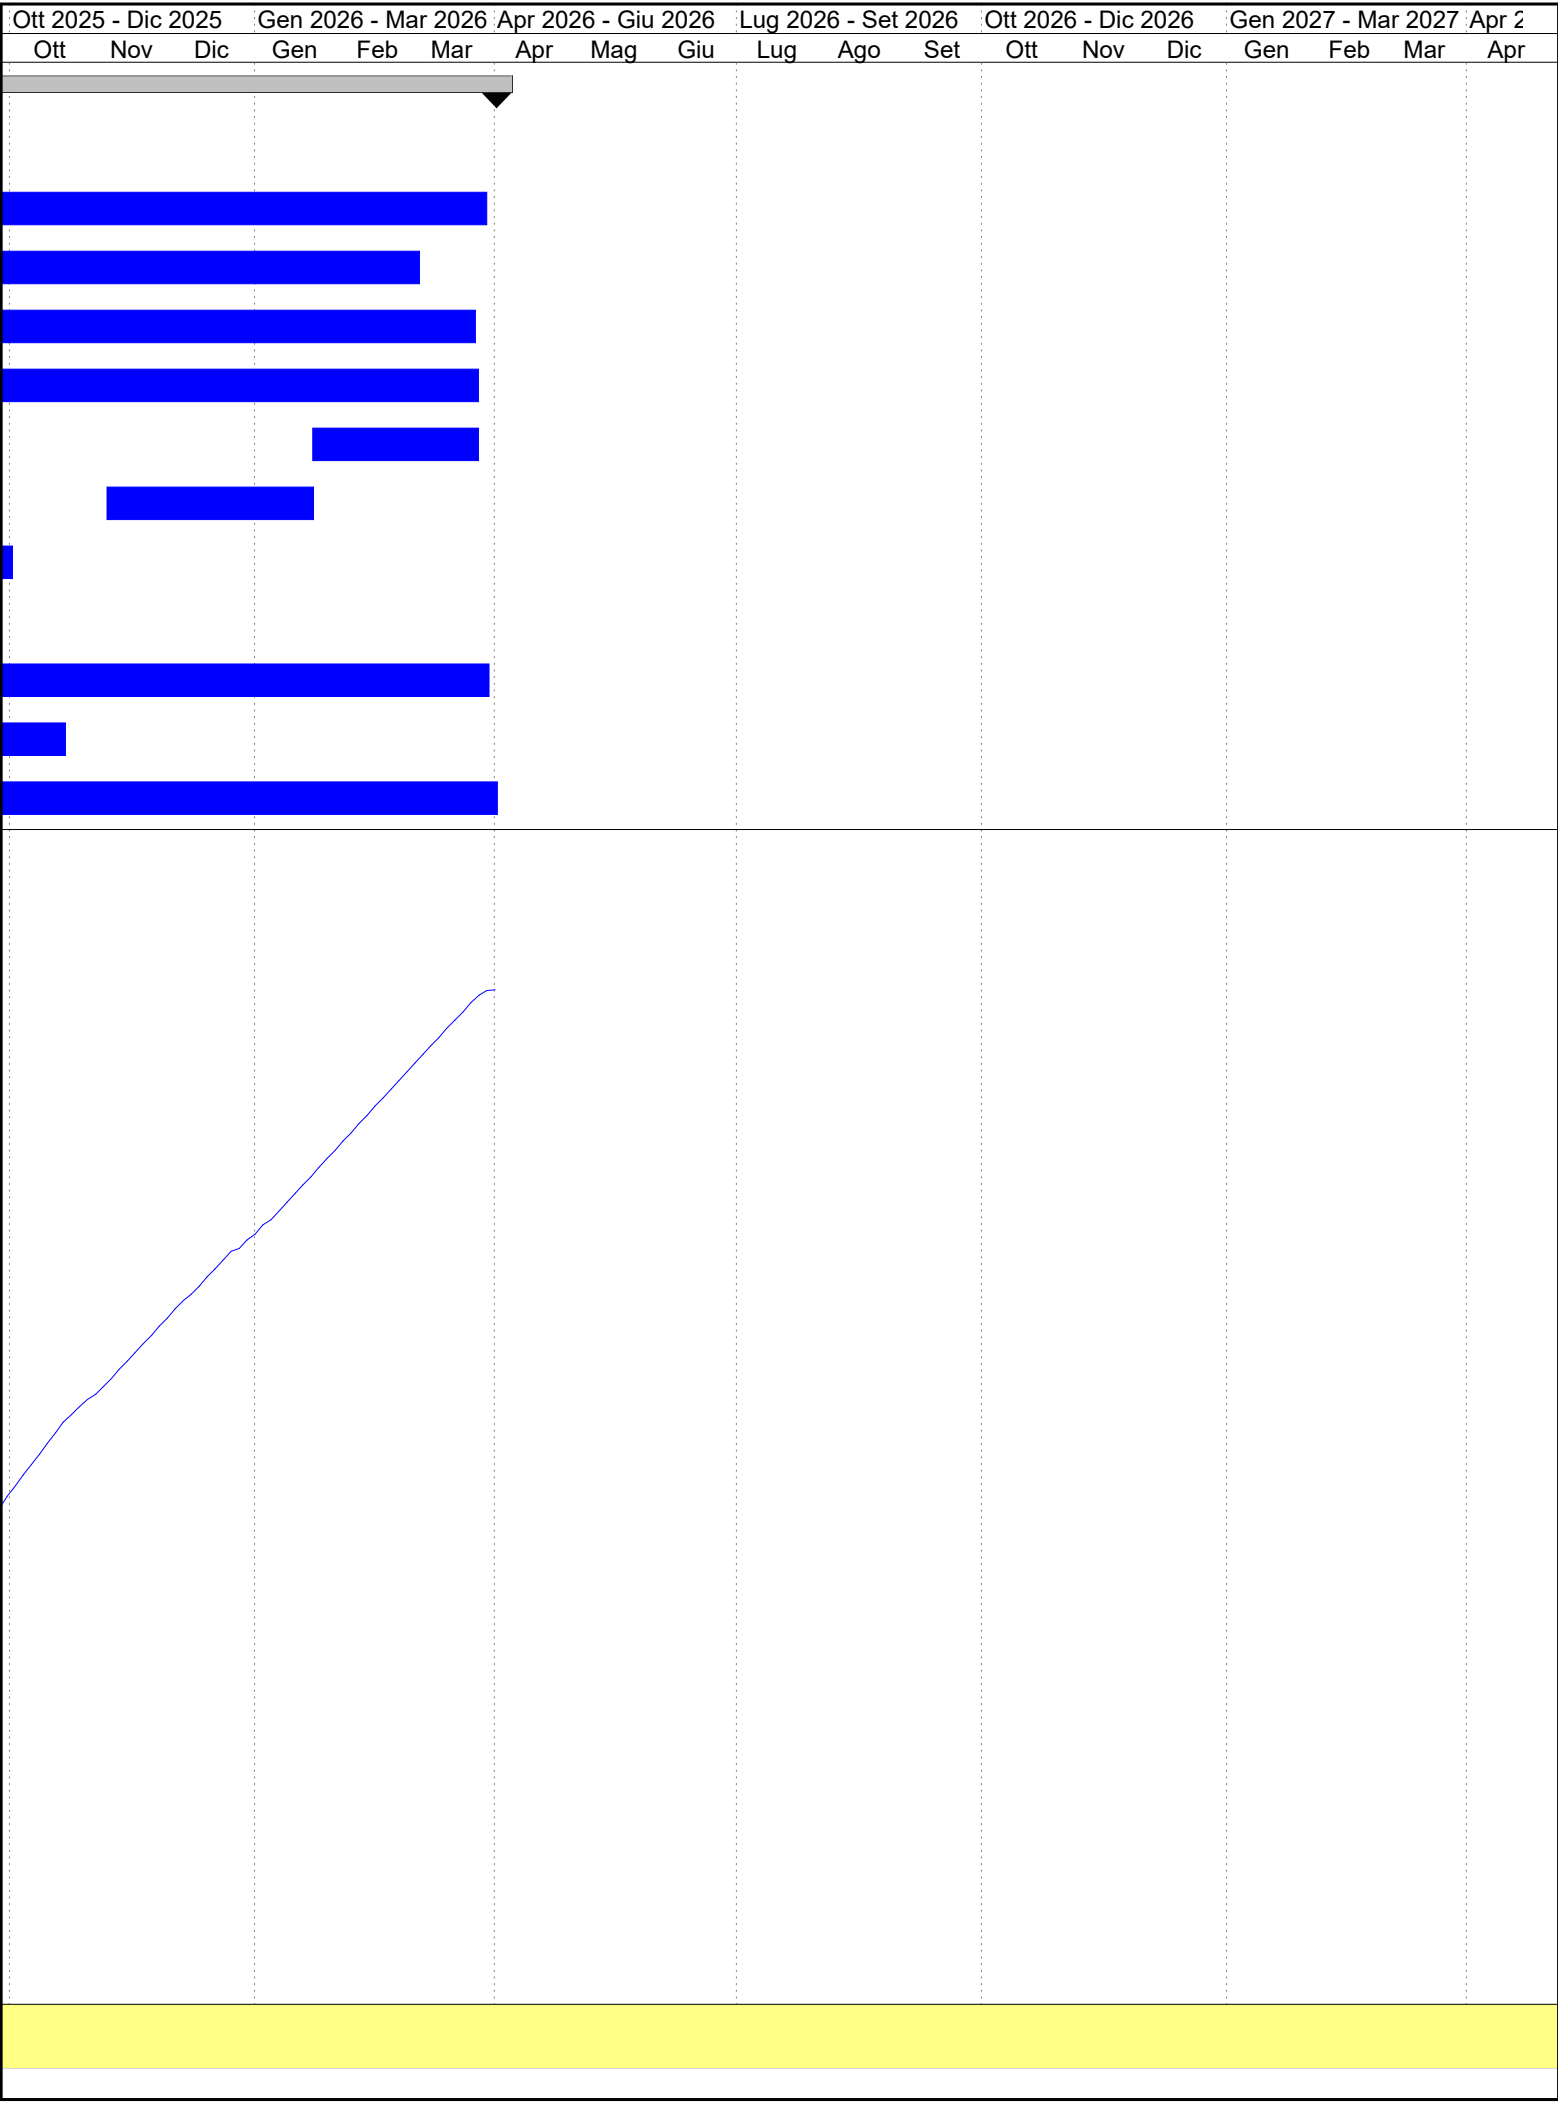

**Comune di Pontecagnano Faiano**  
**Provincia di Salerno**

**Tabella Attività**

**OGGETTO:** INTERVENTO DENOMINATO "EX CAMINO REAL" IN VIA MAR MEDITERRANEO E VALORIZZAZIONE CON LA COSTRUZIONE DI UN CENTRO RIFIUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA

**COMMITTENTE:** Amm.ne comunale Pontecagnano Faiano

, 17/01/2025

Il Tecnico  
( )

\_\_\_\_\_

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
<b>Lavori a CORPO</b>	<b>1'707'146,51</b>	<b>100,000</b>	<b>02/04/2025</b>	<b>01/04/2026</b>	<b>354</b>	<b>365</b>
* PULIZIA AREA	135'197,95	7,920	02/04/2025	14/05/2025	40	43
* OPERE EDILI	813'928,85	47,678	22/05/2025	28/03/2026	303	311
* IPIANTI IDRICI	20'929,09	1,226	20/06/2025	03/03/2026	250	257
* IMPIANTI ELETTRICI	62'350,37	3,652	08/08/2025	24/03/2026	222	229
* IMPIANTI TERMICI	79'245,32	4,642	20/06/2025	25/03/2026	272	279
* IMPIANTO FOTOVOLTAICO	35'510,88	2,080	23/01/2026	25/03/2026	62	62
* RETI IDRICHE E FOGNARIE	39'040,79	2,287	07/11/2025	22/01/2026	72	77
* IMPIANTO DI IRRIGAZIONE	20'800,00	1,218	11/09/2025	01/10/2025	21	21
* ILLUMINAZIONE ESTERNA	21'565,86	1,263	11/06/2025	01/07/2025	21	21
* SISTEMAZIONI ESTERNE AREA PALAZZINA	231'833,14	13,580	19/06/2025	29/03/2026	277	284
* SISTEMAZIONI ESTERNE AREA IN DISPONIBILITA' COMUNE	197'874,97	11,591	17/06/2025	21/10/2025	126	127
* SICUREZZA	48'869,29	2,863	02/04/2025	01/04/2026	354	365
 Data, 17/01/2025						
 <b>Tecnico</b>						

**Comune di Pontecagnano Faiano**  
**Provincia di Salerno**

**Tabella Date e Importi**

**OGGETTO:** INTERVENTO DENOMINATO "EX CAMINO REAL" IN VIA MAR MEDITERRANEO E VALORIZZAZIONE CON LA COSTRUZIONE DI UN CENTRO RIFIUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA

**COMMITTENTE:** Amm.ne comunale Pontecagnano Faiano

, 17/01/2025

Il Tecnico  
( )

\_\_\_\_\_



DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
02/04/2025	3'518,00	3'518,00	0,206
03/04/2025	3'518,00	7'036,00	0,412
04/04/2025	3'518,00	10'553,99	0,618
05/04/2025	3'518,00	14'071,99	0,824
06/04/2025	3'518,00	17'589,99	1,030
07/04/2025	3'518,00	21'107,99	1,236
08/04/2025	3'518,00	24'625,98	1,443
09/04/2025	3'518,00	28'143,98	1,649
10/04/2025	3'518,00	31'661,98	1,855
11/04/2025	3'518,00	35'179,98	2,061
12/04/2025	3'518,00	38'697,97	2,267
13/04/2025	3'518,00	42'215,97	2,473
14/04/2025	3'518,00	45'733,97	2,679
15/04/2025	3'518,00	49'251,97	2,885
16/04/2025	3'518,00	52'769,96	3,091
17/04/2025	3'518,00	56'287,96	3,297
18/04/2025	3'518,00	59'805,96	3,503
19/04/2025	3'518,00	63'323,96	3,709
20/04/2025	3'518,00	66'841,95	3,915
22/04/2025	3'518,00	70'359,95	4,121
23/04/2025	3'518,00	73'877,95	4,328
24/04/2025	3'518,00	77'395,95	4,534
26/04/2025	3'518,00	80'913,94	4,740
27/04/2025	3'518,00	84'431,94	4,946
28/04/2025	3'518,00	87'949,94	5,152
29/04/2025	3'518,00	91'467,94	5,358
30/04/2025	3'518,00	94'985,93	5,564
02/05/2025	3'518,00	98'503,93	5,770
03/05/2025	3'518,00	102'021,93	5,976
04/05/2025	3'518,00	105'539,93	6,182
05/05/2025	3'518,00	109'057,93	6,388
06/05/2025	3'518,00	112'575,92	6,594
07/05/2025	3'518,00	116'093,92	6,800
08/05/2025	3'518,00	119'611,92	7,007
09/05/2025	3'518,00	123'129,92	7,213
10/05/2025	3'518,00	126'647,91	7,419
11/05/2025	3'518,00	130'165,91	7,625
12/05/2025	3'518,00	133'683,91	7,831
13/05/2025	3'518,00	137'201,91	8,037
14/05/2025	3'518,00	140'719,90	8,243
15/05/2025	138,05	140'857,95	8,251
16/05/2025	138,05	140'996,00	8,259
17/05/2025	138,05	141'134,05	8,267
18/05/2025	138,05	141'272,10	8,275
19/05/2025	138,05	141'410,15	8,283
20/05/2025	138,05	141'548,20	8,292
21/05/2025	138,05	141'686,25	8,300
22/05/2025	2'824,28	144'510,53	8,465
23/05/2025	2'824,28	147'334,81	8,630
24/05/2025	2'824,28	150'159,09	8,796
25/05/2025	2'824,28	152'983,38	8,961
26/05/2025	2'824,28	155'807,66	9,127
27/05/2025	2'824,28	158'631,94	9,292
28/05/2025	2'824,28	161'456,23	9,458
29/05/2025	2'824,28	164'280,51	9,623
30/05/2025	2'824,28	167'104,79	9,789
31/05/2025	2'824,28	169'929,07	9,954
01/06/2025	2'824,28	172'753,36	10,119
03/06/2025	2'824,28	175'577,64	10,285
04/06/2025	2'824,28	178'401,92	10,450
05/06/2025	2'824,28	181'226,20	10,616
06/06/2025	2'824,28	184'050,49	10,781
07/06/2025	2'824,28	186'874,77	10,947
08/06/2025	2'824,28	189'699,05	11,112
09/06/2025	2'824,28	192'523,33	11,277
10/06/2025	2'824,28	195'347,62	11,443

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
11/06/2025	3'851,23	199'198,85	11,669
12/06/2025	3'851,23	203'050,07	11,894
13/06/2025	3'851,23	206'901,30	12,120
14/06/2025	3'851,23	210'752,53	12,345
15/06/2025	3'851,23	214'603,76	12,571
16/06/2025	3'851,23	218'454,99	12,796
17/06/2025	5'421,66	223'876,65	13,114
18/06/2025	5'421,66	229'298,32	13,432
19/06/2025	6'258,61	235'556,92	13,798
20/06/2025	6'633,67	242'190,59	14,187
21/06/2025	6'633,67	248'824,26	14,575
22/06/2025	6'633,67	255'457,93	14,964
23/06/2025	6'633,67	262'091,59	15,353
24/06/2025	6'633,67	268'725,26	15,741
25/06/2025	6'633,67	275'358,93	16,130
26/06/2025	6'633,67	281'992,59	16,518
27/06/2025	6'633,67	288'626,26	16,907
28/06/2025	6'633,67	295'259,93	17,296
29/06/2025	6'633,67	301'893,59	17,684
30/06/2025	6'633,67	308'527,26	18,073
01/07/2025	6'633,67	315'160,93	18,461
02/07/2025	5'606,72	320'767,65	18,790
03/07/2025	5'606,72	326'374,37	19,118
04/07/2025	5'606,72	331'981,09	19,447
05/07/2025	5'606,72	337'587,82	19,775
06/07/2025	5'606,72	343'194,54	20,103
07/07/2025	5'606,72	348'801,26	20,432
08/07/2025	5'606,72	354'407,98	20,760
09/07/2025	5'606,72	360'014,70	21,089
10/07/2025	5'606,72	365'621,42	21,417
11/07/2025	5'606,72	371'228,14	21,746
12/07/2025	5'606,72	376'834,86	22,074
13/07/2025	5'606,72	382'441,58	22,402
14/07/2025	5'606,72	388'048,31	22,731
15/07/2025	5'606,72	393'655,03	23,059
16/07/2025	5'606,72	399'261,75	23,388
17/07/2025	5'606,72	404'868,47	23,716
18/07/2025	5'606,72	410'475,19	24,045
19/07/2025	5'606,72	416'081,91	24,373
20/07/2025	5'606,72	421'688,63	24,701
21/07/2025	5'606,72	427'295,35	25,030
22/07/2025	5'606,72	432'902,07	25,358
23/07/2025	5'606,72	438'508,80	25,687
24/07/2025	5'606,72	444'115,52	26,015
25/07/2025	5'606,72	449'722,24	26,344
26/07/2025	5'606,72	455'328,96	26,672
27/07/2025	5'606,72	460'935,68	27,000
28/07/2025	5'606,72	466'542,40	27,329
29/07/2025	5'606,72	472'149,12	27,657
30/07/2025	5'606,72	477'755,84	27,986
31/07/2025	5'606,72	483'362,56	28,314
01/08/2025	5'606,72	488'969,29	28,642
02/08/2025	5'606,72	494'576,01	28,971
03/08/2025	5'606,72	500'182,73	29,299
04/08/2025	5'606,72	505'789,45	29,628
05/08/2025	5'606,72	511'396,17	29,956
06/08/2025	5'606,72	517'002,89	30,285
07/08/2025	5'606,72	522'609,61	30,613
08/08/2025	5'887,58	528'497,19	30,958
09/08/2025	5'887,58	534'384,77	31,303
10/08/2025	5'887,58	540'272,35	31,648
11/08/2025	5'887,58	546'159,93	31,993
12/08/2025	5'887,58	552'047,51	32,337
13/08/2025	5'887,58	557'935,08	32,682
14/08/2025	5'887,58	563'822,66	33,027
16/08/2025	5'887,58	569'710,24	33,372

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
17/08/2025	5'887,58	575'597,82	33,717
18/08/2025	5'887,58	581'485,40	34,062
19/08/2025	5'887,58	587'372,98	34,407
20/08/2025	5'887,58	593'260,56	34,752
21/08/2025	5'887,58	599'148,14	35,096
22/08/2025	5'887,58	605'035,71	35,441
23/08/2025	5'887,58	610'923,29	35,786
24/08/2025	5'887,58	616'810,87	36,131
25/08/2025	5'887,58	622'698,45	36,476
26/08/2025	5'887,58	628'586,03	36,821
27/08/2025	5'887,58	634'473,61	37,166
28/08/2025	5'887,58	640'361,19	37,511
29/08/2025	5'887,58	646'248,76	37,855
30/08/2025	5'887,58	652'136,34	38,200
31/08/2025	5'887,58	658'023,92	38,545
01/09/2025	5'887,58	663'911,50	38,890
02/09/2025	5'887,58	669'799,08	39,235
03/09/2025	5'887,58	675'686,66	39,580
04/09/2025	5'887,58	681'574,24	39,925
05/09/2025	5'887,58	687'461,82	40,270
06/09/2025	5'887,58	693'349,39	40,615
07/09/2025	5'887,58	699'236,97	40,959
08/09/2025	5'887,58	705'124,55	41,304
09/09/2025	5'887,58	711'012,13	41,649
10/09/2025	5'887,58	716'899,71	41,994
11/09/2025	6'878,05	723'777,76	42,397
12/09/2025	6'878,05	730'655,82	42,800
13/09/2025	6'878,05	737'533,87	43,203
14/09/2025	6'878,05	744'411,93	43,606
15/09/2025	6'878,05	751'289,98	44,009
16/09/2025	6'878,05	758'168,04	44,411
17/09/2025	6'878,05	765'046,09	44,814
18/09/2025	6'878,05	771'924,15	45,217
19/09/2025	6'878,05	778'802,20	45,620
20/09/2025	6'878,05	785'680,26	46,023
21/09/2025	6'878,05	792'558,31	46,426
22/09/2025	6'878,05	799'436,37	46,829
23/09/2025	6'878,05	806'314,42	47,232
24/09/2025	6'878,05	813'192,48	47,635
25/09/2025	6'878,05	820'070,53	48,038
26/09/2025	6'878,05	826'948,59	48,440
27/09/2025	6'878,05	833'826,64	48,843
28/09/2025	6'878,05	840'704,70	49,246
29/09/2025	6'878,05	847'582,75	49,649
30/09/2025	6'878,05	854'460,81	50,052
01/10/2025	6'878,06	861'338,86	50,455
02/10/2025	5'887,58	867'226,44	50,800
03/10/2025	5'887,58	873'114,02	51,145
04/10/2025	5'887,58	879'001,60	51,490
05/10/2025	5'887,58	884'889,18	51,834
06/10/2025	5'887,58	890'776,76	52,179
07/10/2025	5'887,58	896'664,34	52,524
08/10/2025	5'887,58	902'551,91	52,869
09/10/2025	5'887,58	908'439,49	53,214
10/10/2025	5'887,58	914'327,07	53,559
11/10/2025	5'887,58	920'214,65	53,904
12/10/2025	5'887,58	926'102,23	54,249
13/10/2025	5'887,58	931'989,81	54,593
14/10/2025	5'887,58	937'877,39	54,938
15/10/2025	5'887,58	943'764,97	55,283
16/10/2025	5'887,58	949'652,54	55,628
17/10/2025	5'887,58	955'540,12	55,973
18/10/2025	5'887,58	961'427,70	56,318
19/10/2025	5'887,58	967'315,28	56,663
20/10/2025	5'887,58	973'202,86	57,008
21/10/2025	5'887,58	979'090,44	57,352

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
22/10/2025	4'317,14	983'407,58	57,605
23/10/2025	4'317,14	987'724,73	57,858
24/10/2025	4'317,14	992'041,87	58,111
25/10/2025	4'317,14	996'359,01	58,364
26/10/2025	4'317,14	1'000'676,15	58,617
27/10/2025	4'317,14	1'004'993,30	58,870
28/10/2025	4'317,14	1'009'310,44	59,123
29/10/2025	4'317,14	1'013'627,58	59,376
30/10/2025	4'317,14	1'017'944,72	59,628
31/10/2025	4'317,14	1'022'261,86	59,881
02/11/2025	4'317,14	1'026'579,01	60,134
03/11/2025	4'317,14	1'030'896,15	60,387
04/11/2025	4'317,14	1'035'213,29	60,640
05/11/2025	4'317,14	1'039'530,43	60,893
06/11/2025	4'317,14	1'043'847,58	61,146
07/11/2025	4'859,38	1'048'706,95	61,430
08/11/2025	4'859,38	1'053'566,33	61,715
09/11/2025	4'859,38	1'058'425,70	62,000
10/11/2025	4'859,38	1'063'285,08	62,284
11/11/2025	4'859,38	1'068'144,45	62,569
12/11/2025	4'859,38	1'073'003,83	62,854
13/11/2025	4'859,38	1'077'863,21	63,138
14/11/2025	4'859,38	1'082'722,58	63,423
15/11/2025	4'859,38	1'087'581,96	63,708
16/11/2025	4'859,38	1'092'441,33	63,992
17/11/2025	4'859,38	1'097'300,71	64,277
18/11/2025	4'859,38	1'102'160,08	64,562
19/11/2025	4'859,38	1'107'019,46	64,846
20/11/2025	4'859,38	1'111'878,83	65,131
21/11/2025	4'859,38	1'116'738,21	65,415
22/11/2025	4'859,38	1'121'597,59	65,700
23/11/2025	4'859,38	1'126'456,96	65,985
24/11/2025	4'859,38	1'131'316,34	66,269
25/11/2025	4'859,38	1'136'175,71	66,554
26/11/2025	4'859,38	1'141'035,09	66,839
27/11/2025	4'859,38	1'145'894,46	67,123
28/11/2025	4'859,38	1'150'753,84	67,408
29/11/2025	4'859,38	1'155'613,21	67,693
30/11/2025	4'859,38	1'160'472,59	67,977
01/12/2025	4'859,38	1'165'331,97	68,262
02/12/2025	4'859,38	1'170'191,34	68,547
03/12/2025	4'859,38	1'175'050,72	68,831
04/12/2025	4'859,38	1'179'910,09	69,116
05/12/2025	4'859,38	1'184'769,47	69,401
06/12/2025	4'859,38	1'189'628,84	69,685
07/12/2025	4'859,38	1'194'488,22	69,970
09/12/2025	4'859,38	1'199'347,60	70,255
10/12/2025	4'859,38	1'204'206,97	70,539
11/12/2025	4'859,38	1'209'066,35	70,824
12/12/2025	4'859,38	1'213'925,72	71,108
13/12/2025	4'859,38	1'218'785,10	71,393
14/12/2025	4'859,38	1'223'644,47	71,678
15/12/2025	4'859,38	1'228'503,85	71,962
16/12/2025	4'859,38	1'233'363,22	72,247
17/12/2025	4'859,38	1'238'222,60	72,532
18/12/2025	4'859,38	1'243'081,98	72,816
19/12/2025	4'859,38	1'247'941,35	73,101
20/12/2025	4'859,38	1'252'800,73	73,386
21/12/2025	4'859,38	1'257'660,10	73,670
22/12/2025	4'859,38	1'262'519,48	73,955
23/12/2025	4'859,38	1'267'378,85	74,240
24/12/2025	4'859,38	1'272'238,23	74,524
27/12/2025	4'859,38	1'277'097,60	74,809
28/12/2025	4'859,38	1'281'956,98	75,094
29/12/2025	4'859,38	1'286'816,36	75,378
30/12/2025	4'859,38	1'291'675,73	75,663

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
31/12/2025	4'859,38	1'296'535,11	75,948
02/01/2026	4'859,38	1'301'394,48	76,232
03/01/2026	4'859,38	1'306'253,86	76,517
04/01/2026	4'859,38	1'311'113,23	76,801
05/01/2026	4'859,38	1'315'972,61	77,086
07/01/2026	4'859,38	1'320'831,98	77,371
08/01/2026	4'859,38	1'325'691,36	77,655
09/01/2026	4'859,38	1'330'550,74	77,940
10/01/2026	4'859,38	1'335'410,11	78,225
11/01/2026	4'859,38	1'340'269,49	78,509
12/01/2026	4'859,38	1'345'128,86	78,794
13/01/2026	4'859,38	1'349'988,24	79,079
14/01/2026	4'859,38	1'354'847,61	79,363
15/01/2026	4'859,38	1'359'706,99	79,648
16/01/2026	4'859,38	1'364'566,36	79,933
17/01/2026	4'859,38	1'369'425,74	80,217
18/01/2026	4'859,38	1'374'285,12	80,502
19/01/2026	4'859,38	1'379'144,49	80,787
20/01/2026	4'859,38	1'384'003,87	81,071
21/01/2026	4'859,38	1'388'863,24	81,356
22/01/2026	4'859,37	1'393'722,62	81,640
23/01/2026	4'889,90	1'398'612,51	81,927
24/01/2026	4'889,90	1'403'502,41	82,213
25/01/2026	4'889,90	1'408'392,31	82,500
26/01/2026	4'889,90	1'413'282,21	82,786
27/01/2026	4'889,90	1'418'172,11	83,073
28/01/2026	4'889,90	1'423'062,01	83,359
29/01/2026	4'889,90	1'427'951,90	83,646
30/01/2026	4'889,90	1'432'841,80	83,932
31/01/2026	4'889,90	1'437'731,70	84,218
01/02/2026	4'889,90	1'442'621,60	84,505
02/02/2026	4'889,90	1'447'511,50	84,791
03/02/2026	4'889,90	1'452'401,40	85,078
04/02/2026	4'889,90	1'457'291,30	85,364
05/02/2026	4'889,90	1'462'181,19	85,651
06/02/2026	4'889,90	1'467'071,09	85,937
07/02/2026	4'889,90	1'471'960,99	86,223
08/02/2026	4'889,90	1'476'850,89	86,510
09/02/2026	4'889,90	1'481'740,79	86,796
10/02/2026	4'889,90	1'486'630,69	87,083
11/02/2026	4'889,90	1'491'520,59	87,369
12/02/2026	4'889,90	1'496'410,48	87,656
13/02/2026	4'889,90	1'501'300,38	87,942
14/02/2026	4'889,90	1'506'190,28	88,229
15/02/2026	4'889,90	1'511'080,18	88,515
16/02/2026	4'889,90	1'515'970,08	88,801
17/02/2026	4'889,90	1'520'859,98	89,088
18/02/2026	4'889,90	1'525'749,87	89,374
19/02/2026	4'889,90	1'530'639,77	89,661
20/02/2026	4'889,90	1'535'529,67	89,947
21/02/2026	4'889,90	1'540'419,57	90,234
22/02/2026	4'889,90	1'545'309,47	90,520
23/02/2026	4'889,90	1'550'199,37	90,806
24/02/2026	4'889,90	1'555'089,27	91,093
25/02/2026	4'889,90	1'559'979,16	91,379
26/02/2026	4'889,90	1'564'869,06	91,666
27/02/2026	4'889,90	1'569'758,96	91,952
28/02/2026	4'889,90	1'574'648,86	92,239
01/03/2026	4'889,90	1'579'538,76	92,525
02/03/2026	4'889,90	1'584'428,66	92,812
03/03/2026	4'889,90	1'589'318,56	93,098
04/03/2026	4'806,18	1'594'124,74	93,379
05/03/2026	4'806,18	1'598'930,92	93,661
06/03/2026	4'806,18	1'603'737,11	93,943
07/03/2026	4'806,18	1'608'543,29	94,224
08/03/2026	4'806,18	1'613'349,47	94,506

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
09/03/2026	4'806,18	1'618'155,65	94,787
10/03/2026	4'806,18	1'622'961,83	95,069
11/03/2026	4'806,18	1'627'768,02	95,350
12/03/2026	4'806,18	1'632'574,20	95,632
13/03/2026	4'806,18	1'637'380,38	95,913
14/03/2026	4'806,18	1'642'186,56	96,195
15/03/2026	4'806,18	1'646'992,75	96,476
16/03/2026	4'806,18	1'651'798,93	96,758
17/03/2026	4'806,18	1'656'605,11	97,039
18/03/2026	4'806,18	1'661'411,29	97,321
19/03/2026	4'806,18	1'666'217,47	97,602
20/03/2026	4'806,18	1'671'023,66	97,884
21/03/2026	4'806,18	1'675'829,84	98,166
22/03/2026	4'806,18	1'680'636,02	98,447
23/03/2026	4'806,18	1'685'442,20	98,729
24/03/2026	4'806,18	1'690'248,39	99,010
25/03/2026	4'525,33	1'694'773,71	99,275
26/03/2026	3'661,23	1'698'434,94	99,490
27/03/2026	3'661,23	1'702'096,16	99,704
28/03/2026	3'661,22	1'705'757,38	99,919
29/03/2026	974,99	1'706'732,37	99,976
30/03/2026	138,05	1'706'870,42	99,984
31/03/2026	138,05	1'707'008,47	99,992
01/04/2026	138,05	1'707'146,52	100,000
Data, 17/01/2025			
Tecnico			
